


大分リハビリテーション病院 一般撮影室 平面図（清書）

現地手書き（操作室=上・壁=太線）を基準に作図／壁の途切れ=建具・窓／柱=壁柱／開き勝手・建具は図面アプリ準拠／寸法mm・CH=2790

※後日訂正（2026-08-10 実態反映）
C面はFE-76251の記載誤り。実施はA面と同じFE-76751

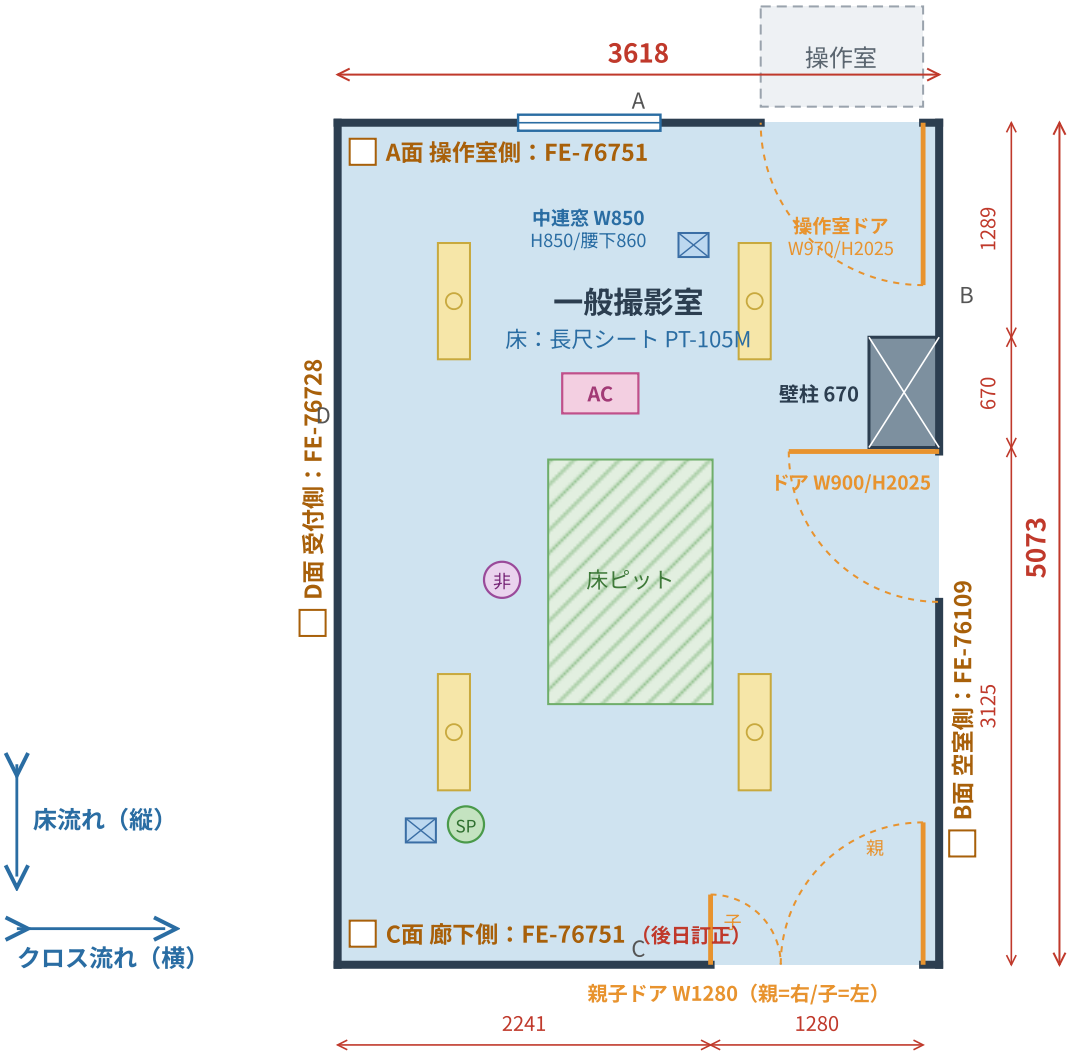

凡例

- 床 長尺シート (PT-105M)
- 壁クロス品番 (サンゲツFE)
- 壁 (手書き太線=マジック)
- 壁柱
- 建具 (ドア・親子ドア／内開き)
- 窓
- 照明 40W×2
- 換気扇
- AC (エアコン)
- 床ピット
- 非 (非常灯)
- SP (スピーカー)


仕上げ・数量メモ

- 床：長尺シート PT-105M（流れ=縦）
- 巾木：田島 No.80（品番。※高さではない）
- 天井：サンゲツ FE-76202（ルーバー〔エア吹出〕有）
- 壁クロス（サンゲツ・壁=縦貼り／天井=横流れ）：
A面 操作室側 FE-76751 / C面 廊下側 FE-76751（後日訂正・A面と同柄）
D面 受付側 FE-76728 / B面 空室側 FE-76109
- 建具：操作室ドアW970／ドアW900（H2025）／親子ドアW1280(親右子左)
中連窓 W850・H850（腰下860） ドアは内開き（実線=扉/点線=軌道）
- 壁柱 670（B面）／CH=2790／W3618×D5073
- 数量（見_改2）：床 18㎡ / 壁クロス 49㎡
- ※ 壁品番は島津図(操作室=下)を180°回転し各壁へ対応。形状・数量は概略。

施工：7/18(土)・19(日) 土日施工（剥取・貼替・清掃／騒音発生）。設置工程表7/17-21・使用開始7/21。

大分リハビリテーション病院 一般撮影室 床割付図（長尺シート PT-105M）

シート巾1820／流れ＝縦（縦割り）／2列(1820+1798)・縦継ぎ1本／開口位置・壁柱を表示／寸法mm

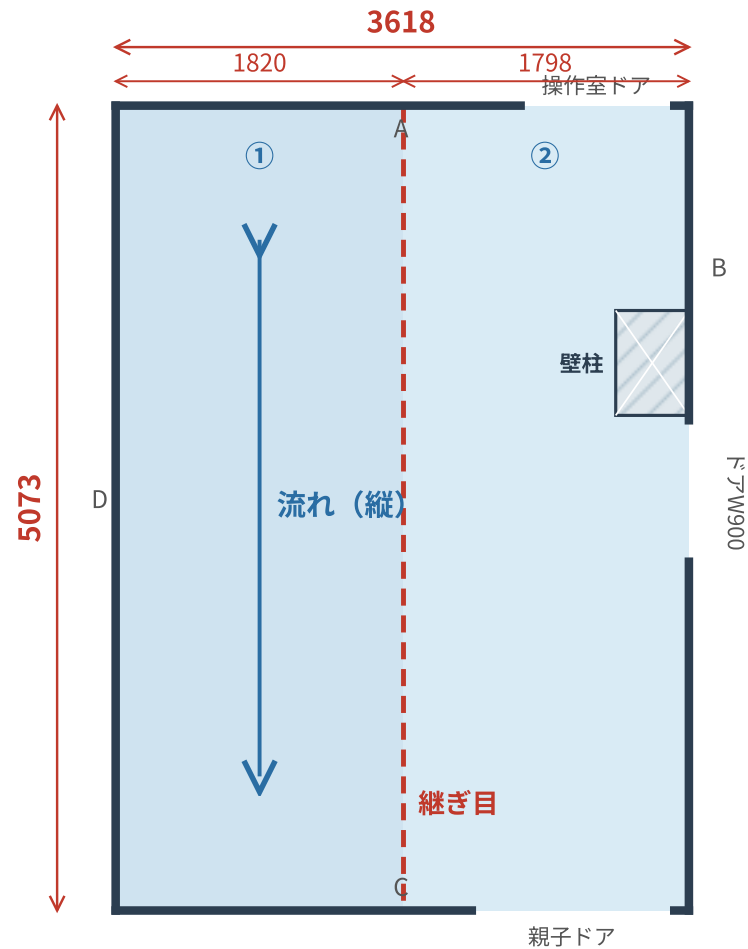

床割付・数量

- 材料：長尺シート **PT-105M**
- シート巾：1820mm／流れ＝縦
- 割付：縦割り **2列**（1820+1798）
- 継ぎ目：縦 **1本**（左端から1820）
- 各列長さ：5073（+上下しろ）
- 施工面積：約 **18.35㎡**（見積18㎡）
- 発注長：2列×5073＝10,146mm
＋ロス10% ≒ **11.2m**（巾1820）

※ 壁柱・建具下は通し張り後カット。継ぎ位置は
撮影台・動線を見て現場調整可。

寸法は清書基準・概略／発注前に最終確認。

施工：7/18(土)・19(日)。床は既存撤去後、長尺シート貼替（巾木＝田島No.80共）。

大分リハビリテーション病院 一般撮影室 壁・天井クロス割付図① 展開図 (サンゲツ FE)

壁＝縦貼り・貼り出しは右から左（各面とも右角スタート）／点線は正面視（B面は奥行＝柱側面の巻込を投影。実材増の根拠は②）

緑＝端材流用（ドア上枠から下のみ）：ドア上は横1枚を角から貼り、脇の小幅(≒10cm)は縦1本取らず端材(内)を横継ぎ流用＝総m圧縮（無地◎／リピート柄A・C・Dは柄合わせで限定）


※後日訂正（2026-08-10 実態反映）

C面はFE-76251の記載誤り。実施はA面と同じFE-76751（柄合わせ要）

A面 操作室側 FE-76751

◀ 貼り出し（右→左）


縦貼り4短冊／柄合わせ要(タテ642)・柄物＝端材流用は限定

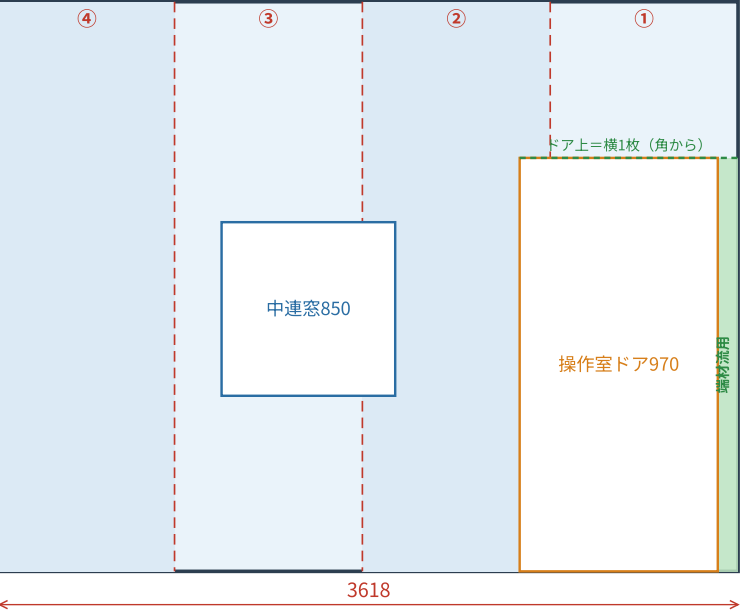

B面 空室側 FE-76109

◀ 貼り出し（右→左）


正面視 幅5073・右起点／920は奥行(柱側面459×2)を巻込んで計測＝点線位置／⑤⑥の継ぎは柱側面＝②

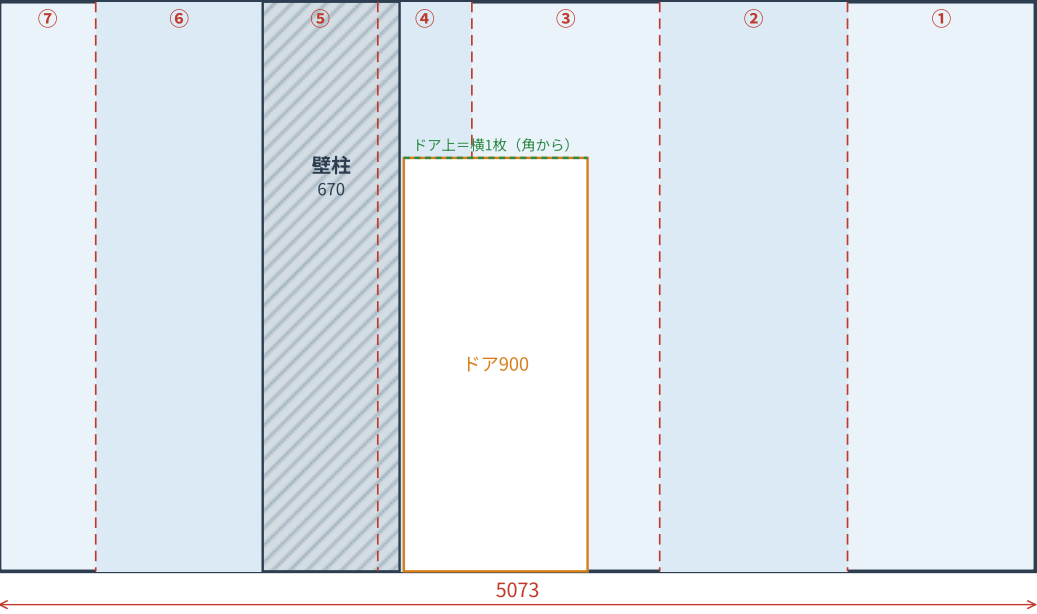

C面 廊下側 FE-76751（後日訂正：旧記載FE-76251は誤り）

◀ 貼り出し（右→左）


縦貼り4短冊／柄合わせ要(タテ642)・柄物＝端材流用は限定

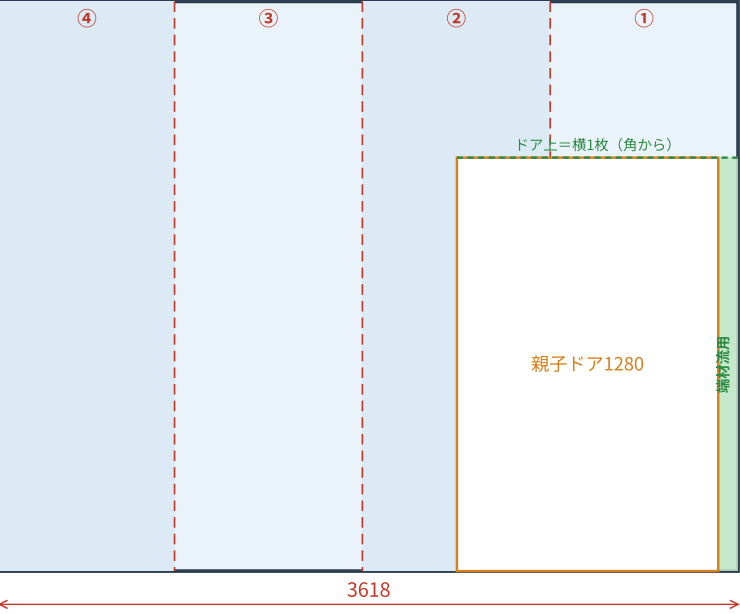

D面 受付側 FE-76728

◀ 貼り出し（右→左）

縦貼り6短冊／ステップ柄合わせ要(タテ321)

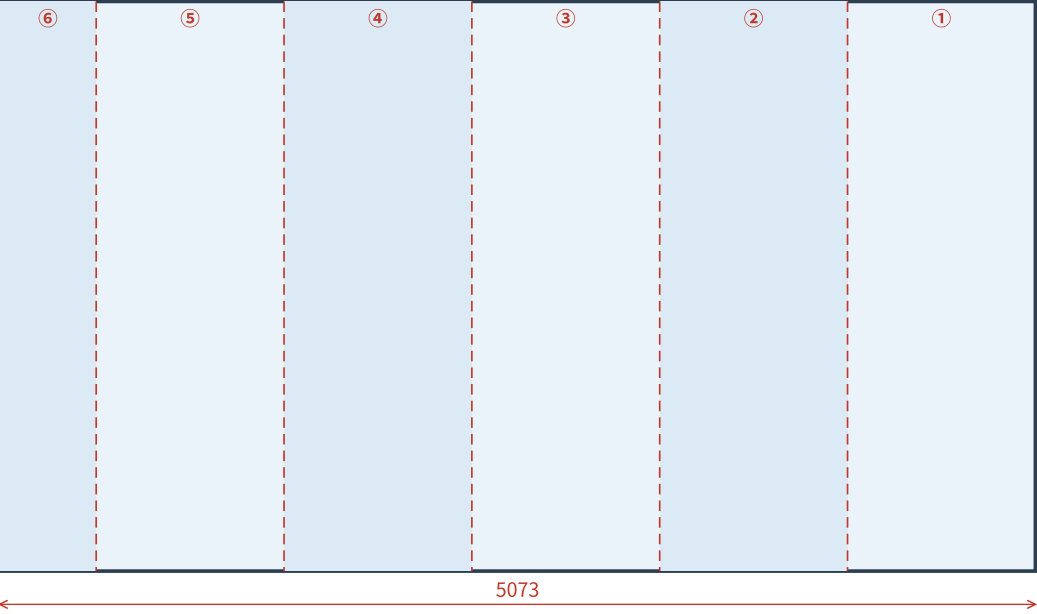

クロス割付図② 品番別 発注数量・壁柱の巻込詳細（サンゲツ FE・920巾）

切寸＝CH2790＋上下しろ100。柄ありは切寸をタテリピートの倍数に切上。各品番とも50m乱×1本で充足（切売りなら下表m）。

※後日訂正（2026-08-10 実態反映）
C面はFE-76251でなくA面と同じFE-76751（柄合わせ要）で施工。下表FE-76251行は当初計画値。

品番	面・隣接室	貼り方	短冊/帯	1本切寸(柄込)	切寸計	発注目安	柄合わせ
FE-76751	A面 操作室側	縦貼り	4	642×5＝3,210	12.8m	14m	要（タテ642）
FE-76109	B面 空室側	縦貼り	7	2,890	20.2m	22m	不要（柱巻込含む）
FE-76251 →実施はFE-76751	C面 廊下側 (後日訂正・A面と同柄)	縦貼り	4	2,890	11.6m	13m	不要（無地貼可）
FE-76728	D面 受付側	縦貼り	6	321×10＝3,210	19.3m	21m	要（ステップ321）
FE-76202	天井	横流れ	6帯	帯長3,618	21.7m	24m	不要

○ 壁クロス正味 ≒ 49㎡（見_改2）＋柱巻込分 ≒ +2.6㎡／天井 ≒ 20㎡。切寸計 ≒ 86m／発注目安 計 ≒ 94m。

天井 FE-76202（横流れ）



★ B面 壁柱の巻込（平面・拡大）



※ 発注前の確認事項

- 柄合わせ要：A・C面 FE-76751(タテ642)・D面 FE-76728(タテ321ステップ)。C面は後日訂正＝表のFE-76251行は当初計画値のまま。
- FE-76728 はステップ(半割れ)柄＝隣接短冊を½リピートずらすため、端短冊で +½リピート程度のロスを別途見込む。
- ドア上は横1枚を角から貼り、脇の小幅(≒10cm)は縦1本取らず＝ドア上枠から下のみ端材(内)を横継ぎ流用して総m圧縮（①の緑＝上枠下のみ）。端短冊は入隅で回す/逃がす。
- 無地(B76109/天井76202)は端材流用が効く。リピート柄(A・C76751/D76728)は柄合わせで流用限定。短冊数・表は流用前の保守値（発注は現場判断で圧縮可）。
- 壁柱の突出459は現地スケッチ値。実測でB面短冊数(境界6.5付近)が変わり得るため、発注前に柱の見込寸法を実測確認。
- リピート無：B面 FE-76109・天井 FE-76202＝柄合わせ不要。C面は実施FE-76751＝柄合わせ要（旧記載「無地貼可」は誤り・後日訂正）。天井ルーバー(エアー吹出)開口は別途カット。

寸法は清書基準・概略。発注前にサンゲツ在庫・ロット・巾(92cm)・50m乱単位を最終確認すること。

■大分リハビリテーション病院 一般撮影室 内部仕上げ表

2026/06/17

※赤字は注記です。ご確認願います。

※グレー字は支給品（お見積り不要）。

※後日訂正（2026-08-10 実態反映）：C面＝FE-76751で施工

室名	床	巾木	壁	天井	その他部材・設備品
	仕上・品名・品番	仕上・品名・品番	仕上・品名・品番	仕上・品名・品番	仕上・品名・品番
一般撮影室	長尺シート PT-105M（タジマ） パーマリュウム/流れ縦	ソフト巾木 タジマ No.80(HB-80) ※品番（高さではない）	ビニルクロス（サンゲツ FE） A面 操作室側：FE-76751 C面 廊下側：FE-76751（後日訂正） D面 受付側：FE-76728 B面 空室側：FE-76109 ※縦貼り。割付は割付図参照	ビニルクロス（サンゲツ） FE-76202 ルーバー（エアー吹出）有 ※横流れ。ルーバー開口控除	【建具】 ・操作室ドア W970/H2025（内開き） ・ドア W900/H2025（内開き） ・親子ドア W1280（親=右/子=左・内開き） 【窓】中連窓 W850×H850（腰下860） 【柱】壁柱 670（B面・室内突出459） CH＝2790 室内 W3618×D5073 ※開き勝手・建具・割付は清書/展開図参照

■備考

○元請：株式会社島津製作所（担当：竹村勝利 / ktake@shimadzu.co.jp）。本工事＝内装（クロス・床シート・巾木）はアート・レイズ。

○施工：7/18(土)・19(日) 土日施工（既存剥取・貼替・清掃／騒音発生）。設置工程表 7/17-21・使用開始 7/21。

○数量（見_改2）：床 18㎡／壁クロス 49㎡。床＝巾1820縦割り2列、壁＝縦貼り(A/C面4短冊・B/D面6短冊)、天井＝横流れ920×6帯。

※ 壁品番は島津レイアウト図（操作室=下）を180°回転し各壁の隣接室で対応付け。FE品番のリピート（柄合わせ）有無・在庫を発注前に確認。

※ 寸法・数量は清書基準の概略。壁柱の見付・見込、入隅/出隅の回し分は別途。発注前に最終確認。


※ 後日訂正（2026-08-10 実態反映）：C面 廊下側は旧記載FE-76251が誤りで、実施はA面と同じFE-76751（白系枝柄・リピート タテ64.2×ヨコ92cm・柄合わせ要）。

■大分リハビリテーション病院 一般撮影室 内装仕上げリスト

2026/06/17





※スウォッチはメーカー公式（サンゲツ FINE 2023-26／田島ルーフィング・タジマ）より。品番・リピートは清書/割付と一致。

※後日訂正（2026-08-10 実態反映）：C面＝FE-76751で施工（旧記載FE-76251は誤り）

面	スウォッチ（代表色）	品番・仕上・備考
天井	 FE-76202	ビニルクロス（サンゲツ） FE-76202 ルーバー（エアー吹出）有 貼り方向＝横流れ（920×6帯／3618方向） サンゲツ FINE 2023-26 リピートなし（石目調）→柄合わせ不要
壁	A:FE-76751 C:FE-76751※訂正 D:FE-76728 B:FE-76109	ビニルクロス（サンゲツ FE／面別3種・A/C面同柄） A面 操作室側 FE-76751 ／ C面 廊下側 FE-76751 （後日訂正・A面と同柄） D面 受付側 FE-76728 ／ B面 空室側 FE-76109 貼り方向＝縦貼り（A/C面4短冊・B/D面6短冊） 数量 約49㎡（開口控除） サンゲツ FINE 2023-26・巾92cm リピート(公式確認)：A・C FE-76751 T64.2/Y92・大柄→柄合わせ要／D FE-76728 T32.1/Y61.8ステップ→柄合わせ要／B FE-76109 無地貼可(リピート無)→不要
床	 PT-105M	長尺シート PT-105M 流れ＝縦（巾1820縦割り2列・縦継ぎ1本） 数量 約18㎡ タジマ パーマリウム ストリート／巾1820・厚2.0mm／重歩行・抗菌・床暖対応
巾木	 田島 No.80	ソフト巾木 タジマ ソフト巾木 No.80（HB-80） ※「80」は品番(HB-80)。高さは40/60/75/100mm展開→要選定

■大分リハビリテーション病院 一般撮影室 建具リスト

※赤字は注記。寸法・開き勝手は清書/展開図基準。建具は既存（仕上・ガラス・金物は現場確認）。

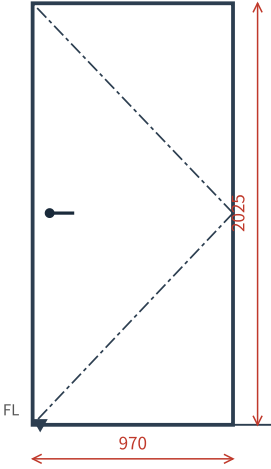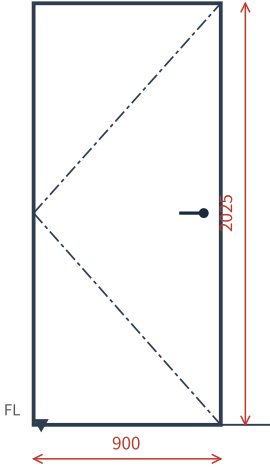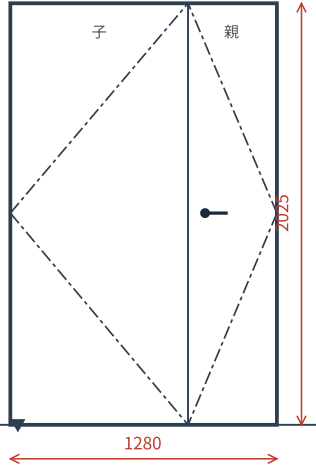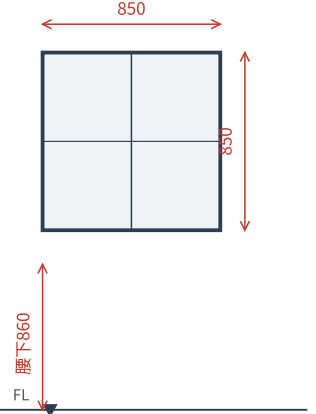姿図	D1 片開きドア 数量 1 	D2 片開きドア 数量 1 	D3 親子ドア 数量 1 	W1 中連窓（引違い） 数量 1 
箇所	A面・操作室側	B面・空室側	C面・廊下側	A面・操作室側
仕上	内開き／吊元右	内開き（壁柱直下）	内開き／親=右・子=左	腰下860
見込	既存（要確認）	既存（要確認）	既存（要確認）	既存（要確認）
ガラス	—	—	—	ガラス種要確認
付属金物	既存（レバー等）	既存	既存	既存（クレセント）
備考	○本工事は内装（クロス・床シート・巾木）。建具は既存のため、本リストは開口・寸法の記録（養生・取合い確認用）。 ○寸法・開き勝手・吊元は清書/展開図に一致。記号 D=ドア／W=窓。FL=床仕上面。姿図の一点鎖線（くの字・吊元側センターで折返）=開き勝手、●=レバーハンドル位置（親子の子扉はハンドル無）。 ※ 建具を更新する場合は、仕上（枠材・塗装）・ガラス（複層/網入等）・付属金物（ハンドル/クローザー）を現場確認のうえ確定。			

■大分リハビリテーション病院 一般撮影室 照明器具リスト

※本工事は内装（クロス・床シート・巾木）。照明は既存・本工事対象外。本リストは既存器具の記録（新築時は型番・姿図・単価を記入するテンプレート）。

符号	場所	器具種別	メーカー	品番・型番	数量	ランプ/W	色温	備考
L1	一般撮影室	ベースライト（蛍光灯 40W×2）	既存 （要確認）	既存	4	FL40W×2	既存	既存利用・本工事対象外。 クロス施工時は養生／脱着要確認。
E1	一般撮影室	非常照明（非常灯）	既存	既存	1	—	—	既存。位置は清書参照。

■備考・凡例

○ 符号：L=一般照明／E=非常・誘導。色分け=照明(黄)・非常灯(紫)は清書の什器色分けと共通。 ○ 既存器具（メーカー/型番/色温/単価）は現場確認。本案件は内装のみのため見積対象外。 ※ クロス・天井施工に伴う器具の一時脱着・養生の要否を島津／病院と確認（撮影機器との取合い注意）。 【新築・改修で器具を選定する場合のテンプレート列】 符号／場所／器具種別／メーカー／品番・型番／数量／ランプ・W／色温(例2700K)／単価／姿図・写真／備考 各器具に製品写真または姿図、定格(lm/W)、ランプ種別、調光要否を添付。復活・変更は赤字＋日付で明示。 ※グレー字=支給品（お見積り不要）。
